



Kontrolní den č. 4

Stavba	Kanalizace a ČOV Býčkovice
Datum	28.6.2023
Předmět jednání	Koordinace postupu před zahájením prací
Podklady	PD, SoD,
REG.Č.	CZ.05.01.04/01/22_021/0000256

HMG Dnes 19.4.2023 oficiální začátek stavby dobo trvání dle SoD max 500dní a tímto se vyzývá dodavatel k plnění smlouvy

-předán

-zahájení výkopů stoka A

Fakturace

05/20232.804 473,74

06/20232.725 628,11

HMG

Objemově plní

Nutná improvizace postupů z důvodu čekání na DIO a dodávku mat.

Různé

1.představeno nové vedení obce

2.schválen dotační titul pro obec ,očekává se podpis ministra

3.schválen subdodavatel fa.Revorgroup s.r.o.-dle smlouvy o dílo zodpovědnost zůstává na BAK

4.předán Plán BOZP

5.schválen archeol.dozor **Mgr.P.Lissek**

- 6.dohodnuty KD týdení režim a v 1.týdnu měsíce velký KD na OU Býčkovice
 7.odesláno nahlášení zač.stavby na OŽP Měú Litoměřice
 8.předána pasportizace dle sml.o dílo
 9.proběhla schůzka s archeol.dohledem-v prostoru Š12-Š11 budou provedeny ručně kopané sondy za účelem zjištění možného výskytu artefaktů zahájení 12.6.2023 **dokopáno viz.zápis v SD a samostatný protokol pro obec**
 10.. možné ukládání vykopaného materiálu. - p.č. 396/1 v k.ú. Velký Újezd.
 Další možnosti: v k.ú. Býčkovice - p.č. 745/2 , p.č. 512/16, 512/17, část p.č. 465/30, 465/32 a 465/33 - poslední dvě již slouží jako zázemí firmy.
 11.diskutována možnost zhotovení dalších přípojek mimo PD,je potřeba oslovit projektanta,podat žádost o rozhodnutí na Měú,dohodnout způsob financování
12.podepsán protokol o vstupu do vozovkyKSUS 27.6.-31.10.2023
13.dohodnut systém kontroly a provedení jedn.přípojek na tzv.kartu přípojky,majitel nemovitosti podepíše buď dle PD,pokud změna zakreslit např.červeně a majitel musí podepsat-tyto karty budou součástí předávané dokumentace
Dnes povoleny změny pro č.p.20 připojit pod Š 57
Č.p.18 za Š57 cca 15m
Pozor změny se musí promítnout ve skutečném provedení PD a samozřejmě v zaměření
14.na AD vzneseny požadavky na určení polohy stoky A Š12-11,archeol.nálezy a vzrostlé břízy vč.dotazů k připojením na kanalizaci

seznam žádostí o změnu, nebo vytvoření nových přípojek :

- p. Kudrna, č.p. 55 - nemá přípojku
 p.Žďárská, č.p. 91 - lze připojení z šachty 34? septik na parcele 689/12
 Matoušovi – č.p. 87 – možnost napojení u šachty 38? Žumpa je na druhé straně baráku, než je nyní uvažované připojení.
 p. Ježková – č.p. 12, přípojka blíže k šachtě 33
 p. Starý – č.p. 5, připojení blíže k domu
 Károvi – č.p. 29, umístění přípojky na p.č. 64/1 (před OÚ). Nyní umístění přípojky na p.č. 68/2. Toto se řešilo na KD.
 Toninioví – novostavba na p.č. 454/2. Není přípojka, na parcele stojí zkolaudovaná DČOV. Bude vyžádán plánec umístění DČOV.

Postup

Stoka B dokončena

A Š21 Š57-58 pokr.dále

A frézování KSUS a příští týden zač.od Š13 proti toku

Úkoly z KD č. 2

2.dotaz na OŽP Litoměřice- určení dočasného, trvalého depozitu (potřebné dokumenty.žádosti

Zodpovídá:obec

Termín:25.5.2023 **trvá**

Úkoly z KD č. 3

3.aktualizace HMG po vydání DIO

Zodpovídá:zhotovitel

Termín:14dní po DIO

Úkoly z KD č. 4

1.starostka zjistí na OŽP,CHKO možnost kácení stromů Š12-11

Zodpovídá:investor

Termín:20.7.2023

2.AD viz.bod 14

Zodpovídá:AD

Termín:20.7.



Schůzka KOO(malý kd) na stavbě ZS 12.7.2023 9,30

Příští KD č.5 se bude konat 26.7.2023 v 9.30 na OÚ v Býčkovcích

Zapsal: Josef Doksanský 2 8.6.2023

Ing. Št.
Ing. Št.
Ing. Št.
J. Horáček
Ing. M. Jiráček
Ing. P. Lippel

12.7.2023
v Býčkovcích

Číslo
Číslo
Číslo
Název

Zápis z kontroly a kontrolního dne koordinátora BOZP



Stavba : „ Kanalizace a ČOV Býčkovice “

DATUM :

28.6.2023

Kontrolu provedl : Z.Moucha


Podpis, razítko :



Požadavky na zhotovitele :

- 1. proškolení a seznámení s Plánem BOZP-kontrola 7.6.2023 splněno**
- 2. dokončení ZS a označení staveniště splněno**

Požadavky na objednatele dle Z 309/2006 Sb., par. 18, bod 2, písm. a), bod 3, které nebyly zhotovitelem odstraněny a je nutné je přímo uplatňovat na zhotoviteli :bez požadavků

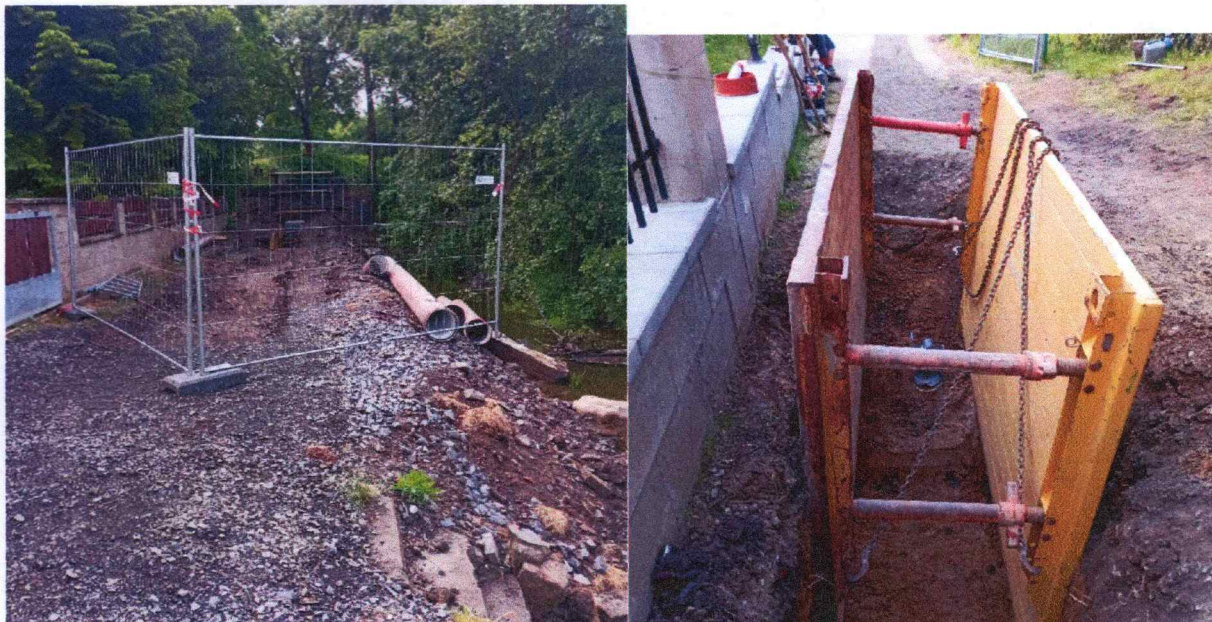

Popis : pracovní prostor je ohrazen ,pažení bez Závad

Opatření : Žádné.

Závěr : Výkop bude vždy pro vstup pracovníků do výkopu zabezpečen pažícími boxy.

Zapsal : dne 28.6.2023 j.Doksanský
